


INFORME DE TRABAJO VOLUNTARIOS PROVINCIA CARCHI  
21-25 de JUNIO del 2017

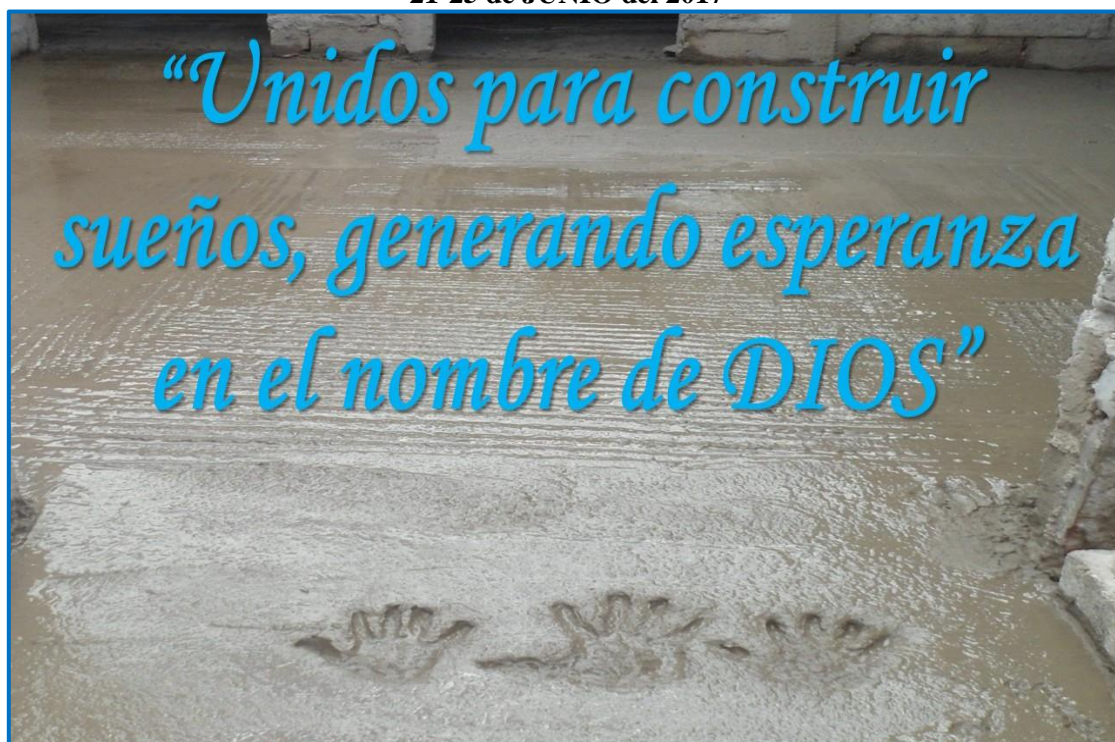

**Comunidad: Pusir Grande**

**Responsables:**

**Grupo de Voluntarios**

- |                     |               |                   |
|---------------------|---------------|-------------------|
| • Danny Couch       | Sam Couch     | Austin Livingston |
| • Kaylen Couch      | Terri Freeman | Antonio Rodriguez |
| • Antonio Rodriguez | Kathy Maguire | Shae Adam         |
| • Shelby Sewell     | Juanita Perez | Janice Ford       |
| • Jerry Mower       | Remy Tercero  |                   |

**Equipo técnico FEDICE:**

- Hugo Pacheco
- Wilma Ulcuango

**Responsables comunidad beneficiarias:**

- Aguedita Julio
- Patricia Palacios
- Reinaldo Sangucho (Israelita Sangucho y Esperanza Reyes)

**Actividades**

a) Construcción casa **REINALDO SANGUCHO.**

Se construyó una vivienda de 36 metros cuadrados. Consta de las siguientes características:

- Cuatro ventanas de aluminio con protección de hierro.
- Puerta metálica principal.
- Sistema eléctrico. Está instalado: cuatro toma corrientes y cuatro focos con la respectiva caja térmica de 2 braker.



b) Construcción de Casa **PATRICIA PALACIOS**.



Construcción de 42 metros cuadrados. Características:

- Cuatro ventanas de aluminio con protección de hierro.
- Puerta metálica principal.
- Sistema eléctrico. Está instalado: cuatro toma corrientes y cuatro focos con la respectiva caja térmica de 2 braker.

c) Terminados casa de **AGUEDITA JULIO**.



Área de construcción 100 metros cuadrados.

- Cuatro ventanas de aluminio con protección de hierro.
- Puerta metálica principal.
- Sistema eléctrico consta de: una caja térmica de 4 braker ,7 focos y 14 toma corrientes.

VIVIENDA	M2 CONTRA-PISO
Patricia	36.52
Aguedita	86.96
Reinaldo	31.30
Total	154.78

#### Trabajo con voluntarios y la comunidad de Pijal Centro

- Fundición de 154.78 metro cuadrados de contra-piso.



*Grupo N°1 Casa de Reinaldo*



*Grupo N°2 Casa de Patricia*



**Grupo N° 3 Casa de Aguedita**

Para realizar la fundición de los 154.78 m2 realizamos tres grupos de trabajo distribuidos en las tres casas. El total de personas trabajando fue 54 personas. (Voluntarios EEUU, Pusir Grande y Pijal Centro)

- Instalación de 90 metros cuadrados de techo.

VIVIENDA	TECHO M2
PATRICIA	42.00
AGUEDITA	12.00
REINALDO	36.00
TOTAL	90.00

**Trabajos ejecutados por las familias**

- E
- x
- c
- a
- v
- a
- c
- i
- ó
- n
- d
- e



cimientos.

- Colaboración para abastecimiento de materiales a maestros.
- Colocación de piedra.
- **Alimentación de maestros.** En promedio cada familia invirtió \$200 dólares para la alimentación de los cuatro maestros que trabajaron durante las tres semanas previas.



Debemos recalcar que las tres familias trabajaron muy fuerte, tres semanas antes de los trabajos previstos con los voluntarios. Las últimas fotos son de las visitas del 6 de junio y 15 de junio.

*Gracias a todos por permitirnos demostrar al mundo que la unión hace la fuerza, no importo el cansancio después de todos los días difíciles de trabajo no, nos rendimos, para ver con gran satisfacción y en primera fila la gran sonrisa de las tres familias.*

### 1. Resumen de gasto

Se invirtió \$8 868.40 en la compra de: hierro, cemento, techo, ventanas y protecciones, puertas. Se pagó en mano de obra \$ 2.820 para la ejecución de los siguientes trabajos: Armado y estructura de hierro, colocación de vigas de hierro, levantamiento de paredes, instalación de sistema eléctrico, apoyo en fundición de contra piso, colocación de puertas, ventanas y protecciones.

DESCRIPCION	VALOR	%
MATERIALES	8,868.40	76%
MANO DE OBRA	2,820.00	24%
<b>TOTAL</b>	<b>11,688.40</b>	<b>100%</b>

PRESUPUESTO ASIGNADO	10,599.51
EJECUCION PRESUPUESTARIA	\$ 11,688.40
<b>DEFICIT</b>	<b>- 1,088.89</b>

Esto nos da una diferencia de \$ 1 088.89 respecto al presupuesto inicial estimado.

Equipo Fedice
